


ISDND de NURLU : Rapport incendie du 13/04/2020

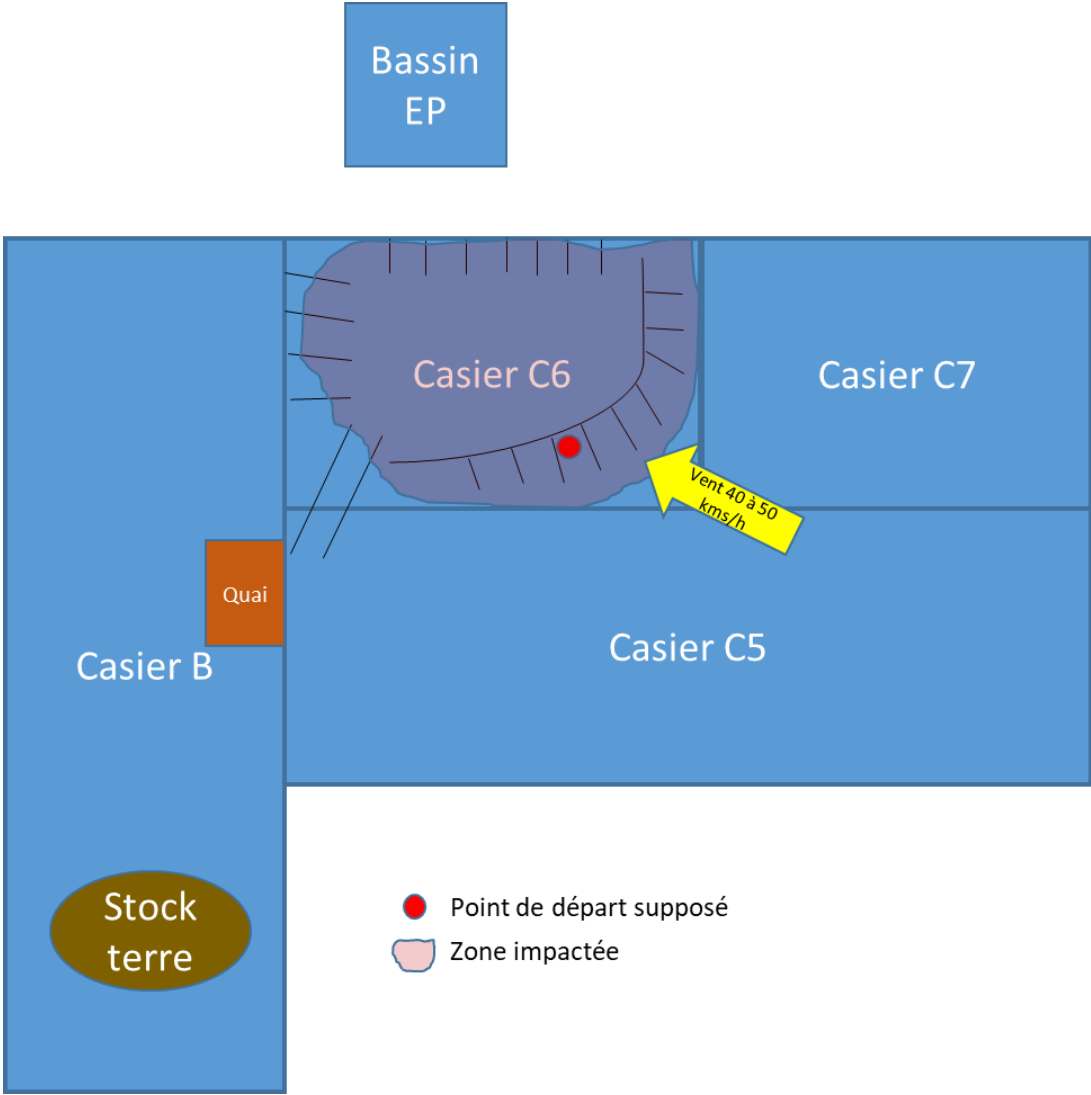

Le Lundi 13/04/2020 à 8H47 la caserne de pompiers de Moislains est appelée pour des fumées suspectes sur le centre de stockage de Nurlu.

Sur place ils constatent un incendie en cours sur le casier C6 et commencent à déployer les moyens d'extinction.

9H03 : les pompiers contactent [REDACTED], directeur de territoire.

9H05 : [REDACTED] contacte [REDACTED], responsable d'agence et [REDACTED], directeur régional

9H08 : [REDACTED] contacte [REDACTED], conducteur d'engin, [REDACTED], conducteur d'engin et [REDACTED], conducteur d'engin.

9H13 : visionnage à distance caméra thermographique, présence fumées mais pas de détection incendie Mise à l'arrêt du dispositif.

9H23 : arrivée sur place de [REDACTED], démarrage des engins, reconnaissance sur zone, compactage des déchets pour éteindre les flammes puis utilisation de la chargeuse à chenilles pour début d'approvisionnement des terres pour recouvrement de la zone (Stock terre disponible 3000 m3)

9H30 : arrivée sur place [REDACTED], présence des gendarmes, prise de contact avec pompiers sur place et mise en place d'un plan d'action.

Pompiers déployés au niveau du quai de vidage pour arrosage étanchéité casier B avec la capacité de leurs véhicules

En attendant le renfort de la caserne de Péronne, [REDACTED], détournement des pompes actifs pour arroser talus côté bassin. Dispositif en partie mis en place, abandon car fumées trop épaisses.

9H40 : arrivée [REDACTED]

9H45 : arrivée [REDACTED] et renfort caserne Péronne.

Déploiement dispositif d'extinction côté bassins par les pompiers équipés pour prendre en compte les émissions de fumées. Pompage dans bassin eaux pluviales par canne d'aspiration (stock bassin 4500 m3)

10H15 : arrivée [REDACTED]

10H30 : arrivée [REDACTED]

11H00 : arrivée renfort caserne Amiens.



Photographie côté quai de déchargement – 11h50

12H00 : arrivée des engins de TP pour accélérer le transport des terres. 2 tracto-bennes + 2 tombereaux.

12H08 : [REDACTED] informe [REDACTED], inspectrice des installations classées.

13H00 : arrivée pelle de chargement en relais de la chargeuse à chenille.

13H00 : arrivée d'un gardien pour sécuriser l'entrée du site.

Mise en place d'un dispositif d'extinction côté C5.

17H15 : arrivée de Monsieur le Sous-Préfet de Péronne.

22H00 : Fin de l'inertage et départ des pompiers.

22H00-7H00 : gardien de nuit, pas de reprise de l'incendie.

Bilan : environ 4000m² parcourus par les flammes y compris des étanchéités en attente. Etanchéité inter-casier B-C6, inter-casier C5-C6 et BSA du flanc du casier C6 côté bassin brûlés.

C7 intacte.

C5 intacte.

Eaux utilisées : environ 1 100 m³

Terres utilisées : environ 2 000 m³
