MAIRIE D'AUNAY-SOUS-AUNEAU
28700

AUNAY-SOUS-AUNEAU

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Téléphone : 02 37 31 81 01
Télécopie : 02 37 31 36 38

Courriel : mairie.aunay-sous-auneau@wanadoo.fr

Annexé 7

DÉCISION DE FINANCEMENT ADEME N°1126C0383
TRAITEMENT DE L'ANCIENNE DÉCHARGE « LES FOURNEAUX »

RAPPORT FINAL

Par décision n° 1126 C 0383 du 2 décembre 2011, l'ADEME a pris les dispositions en vue de soutenir financièrement la commune d'Aunay-sous-Auneau pour le programme de réhabilitation de la décharge du site « Les Fourneaux ».

Compte tenu de l'intérêt d'aménager les abords de cette ancienne décharge, le Conseil Municipal d'Aunay-sous-Auneau a décidé de lancer un programme pluriannuel en 3 phases. Le traitement de l'ancienne décharge est compris dans la phase 1A.

Le rapport d'avancement de début d'opération a été adressé à l'ADEME le 24/10/2012. Ce rapport comprenait :

- Le détail de la procédure de consultation des entreprises.
- Les pièces du marché.
- L'ordre de service notifié à l'entreprise JULIEN et LEGAULT le 3 septembre 2012.
- Une photographie du panneau de chantier.
- Le compte rendu de la première réunion de chantier du 29/08/2012 comprenant le planning des travaux.

Le maître d'œuvre de ce programme a communiqué à l'ADEME et aux différents intervenants les comptes rendus hebdomadaires de chantier par courriels.

La réception des travaux de la phase 1A du programme « Les Fourneaux » comprenant la réhabilitation de l'ancienne décharge a été prononcée le 12/12/2012.

PJ :

Annexe 1 : Descriptif technique des travaux.

Annexe 2 : Planning actualisé Phase 1A.

Annexe 3 : Plan de repérage des terres apportées.

Annexe 4 : Le procès Verbal des opérations préalables à la réception.

Annexe 5 : La proposition du maître d'œuvre.

Annexe 6 : La décision de réception.

Annexe 7 : L'annexe financière n° 2 de la convention de financement.

Annexe 8 : Un état des dépenses enregistrées pour la phase 1A.
(Les références aux différents postes subventionnés par l'ADEME sont libellées A, B, C, D, E, F.)

Annexe 9 : 6 planches de photos.

Annexe 10 : Un plan de l'ensemble du site.

Fait à Aunay-sous-Auneau le 21/12/2012.
Le Maire,

MAIRIE AUNAY-SOUS-AUNEAU 28700

Jacques WEIBEL

Annexe 1

DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

Conformément à l'étude préalable réalisée par le Bureau d'Etude FAIRTEC, et après approbation du marché avec l'Entreprise JULIEN et LEGAULT, le site de l'ancienne décharge municipale du site "Les Fourneaux" a été traité dans le cadre de la phase 1 A du programme communal pluriannuel et ce conformément à la méthodologie développée par l'ADEME.

L'installation a pris en compte la nécessité de garantir les conditions d'accès des ouvriers sur le site en toute sécurité, tout en prévoyant une signalétique interdisant l'accès des particuliers. La configuration des lieux n'a pas nécessité l'application d'un arrêté spécifique de voirie. Un piquetage préalable a permis de distinguer les différentes zones à traiter et l'identification des chemins à créer.

Les travaux de débroussaillage et de nettoyage du site ont été réalisés en septembre 2012. Ces travaux ont nécessité :
- Le ramassage de tous les déchets, leur transport et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur.
- Le tronçonnage des végétaux morts et la suppression des bois morts transportés et évacués.
- La sélection des végétaux de valeur.
- Le fauchage et le broyage de la végétation herbacée et des broussailles.

L'ensemble de cette opération a été réalisé avec du matériel adapté, mécaniquement ou manuellement en prenant soin de ne pas endommager la végétation existante à conserver.

Les travaux de déblais remblais ont été engagés début octobre 2012, ainsi que l'apport de terre végétale : 1 000 m3 environ. Un reprofilage et la stabilisation complète du site ont été réalisés. Ces travaux de nivellement ont permis le remodelage paysager de l'ensemble du site, suivant les courbes de niveau et pentes définies au plan, pour le passage des cheminements et pour un parfait raccord paysager avec l'environnement.
La continuité paysagère des pentes et une fluidité des cheminements ont été respectées par l'entreprise.

La préparation des zones à planter a été réalisée en octobre et début novembre afin de permettre la plantation des jeunes plants et des baliveaux, ainsi que l'engazonnement du site début décembre 2012. Le détail des plantations figure dans la situation de travaux jointe au présent document. Pour les plantations des fosses ont été créées en conformité avec les prescriptions prévues dans le dossier de consultation des entreprises.

Engazonnement: Semis de trèfles blancs.

Regarnissage de la prairie (fourniture de semences de graminées; exécution mécanique du semis, enfouissement des graines puis roulages).

Evacuation des eaux pluviales: 15 caniveaux de drainage transversal ont été réalisés (distant de 20 mètres environ). Ces caniveaux sont conformes aux normes standard (En acier, en U - Rigole d'orage).

La réception des travaux a été prononcée le 12/12/2012.

Annexe 2

PLANNING ACTUALISÉ

- Traitement de l'ancienne décharge Phase 1A -

3 septembre 2012 :	Ordre de service notifié à l'entreprise JULIEN et LEGAULT.
Mi septembre 2012 :	Installation du chantier, mise en place de la signalétique des financeurs et panneaux de chantier ainsi que le piquetage préalable.
Fin septembre 2012 :	Travaux de débroussaillage et nettoyage du site.
Octobre 2012 :	Travaux de déblais remblais, apport de terre végétale, remodelage du site.
Fin octobre - Début novembre 2012 :	Préparation des zones à planter.
Décembre 2012 :	Plantations des plants et des baliveaux ainsi que l'engazonnement.
12 décembre 2012 :	Réception de la phase 1A.

Annexe 3

PLAN DE REPERAGE DES TERRES APPORTÉES

Alluvions de terre Végétale site ancienne décharge "la fourneaux"

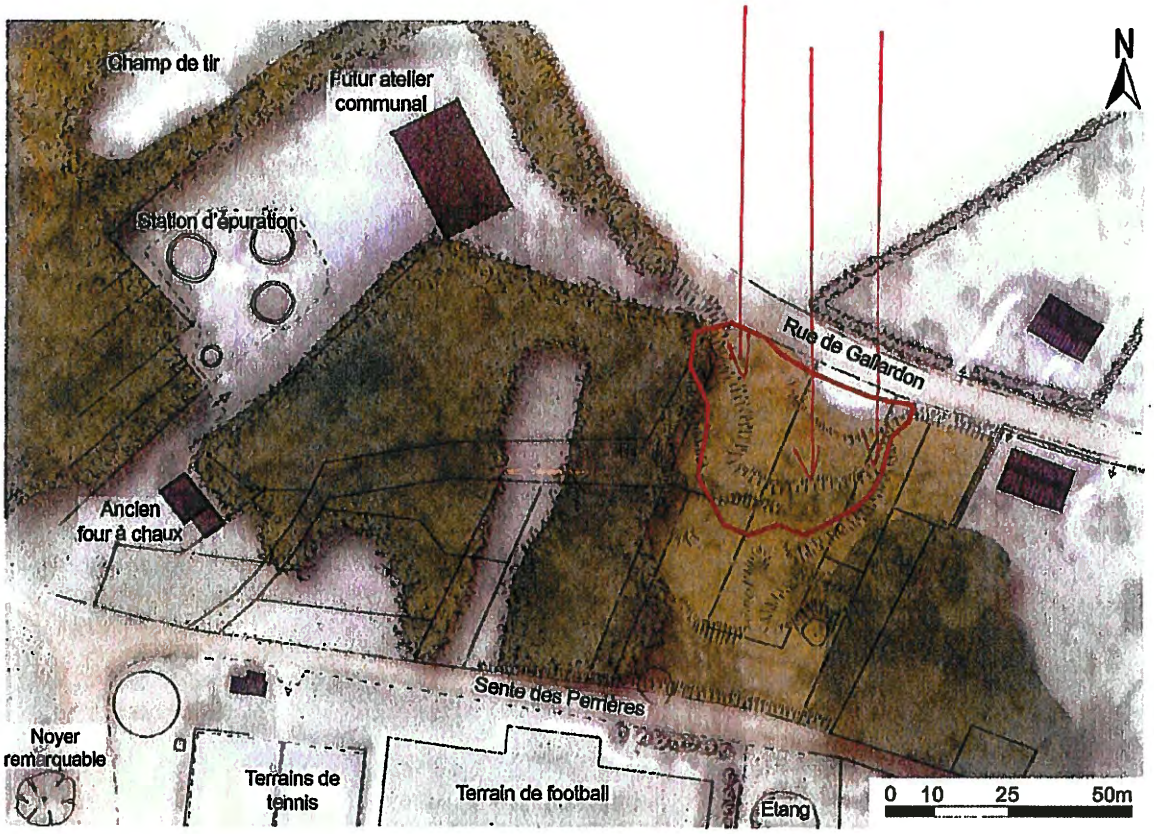

Plan de l'état des lieux de la décharge et de ses abords

Emprise de la décharge

- La décharge et ses abords présentent un relief de talus non stabilisés.

ANNEXE 9.

DESCRIPTIF DU SITE DE L'ANCIENNE DECHARGE "Les Fourneaux" avant travaux

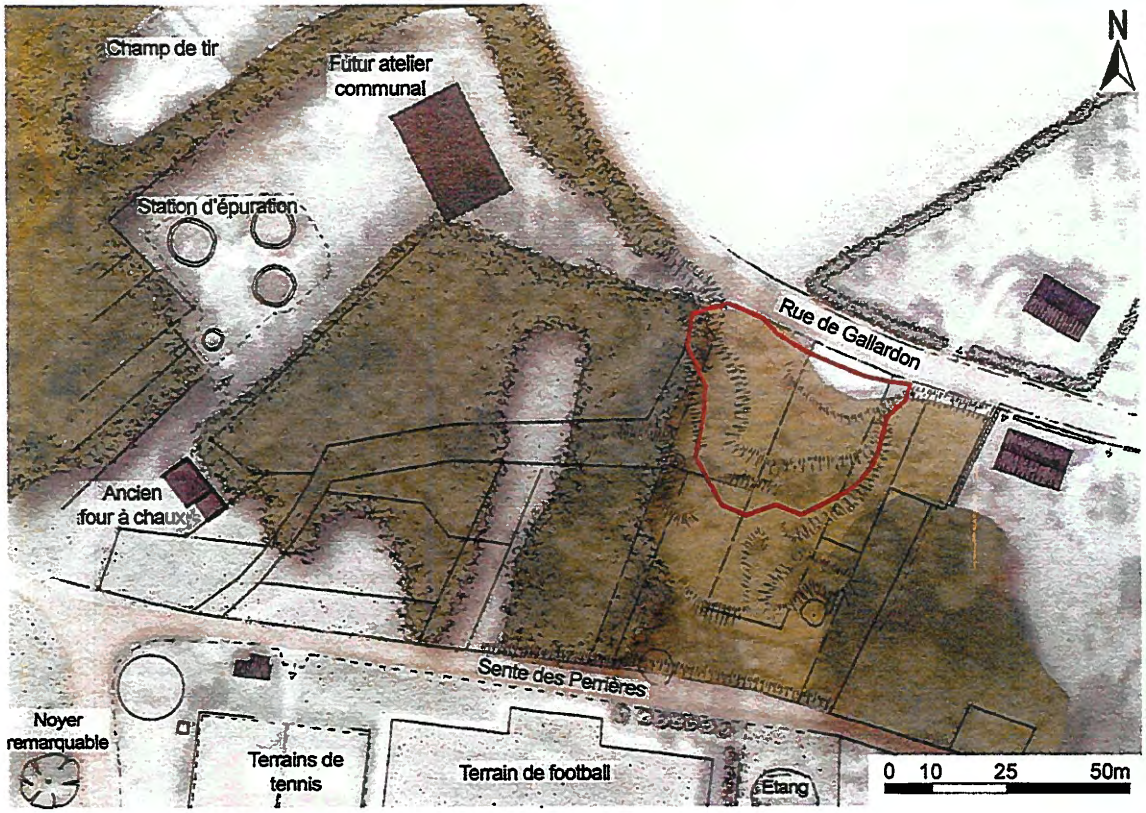

Plan de l'état des lieux de la décharge et de ses abords

Boisement

Friche

Pelouse ou prairie

Emprise de la décharge

- La décharge couvre une surface d'environ 1250 m², pour un volume estimé de 600 m³.
- Les ordures ou gravats ont été abandonnés directement sur le substratum calcaire, puis recouverts d'une couche de terre végétale de 10 à 40 cm. Aujourd'hui la décharge ne produit plus de lixiviats ni de biogaz.
- La décharge et ses abords présentent un relief de talus non stabilisés.
- Elle est couverte par une végétation basse, pionnière. Les déchets ne sont pas apparents.

Depuis l'ancienne décharge, une fenêtre sur le bourg.

Depuis le haut du coteau, les vues se dégagent sur le plateau céréalier. Les lisières boisées cadrent la vue.

Photographies du site (décharge les Fourneaux avant travaux)

Vue du cœur de village et des abords du complexe sportif en direction du coteau des Fourneaux et de la décharge. À l'arrière plan des peupliers vieillissants qui sont destinés à être abattus.

Vue du toit de la décharge sur le coteau des Fourneaux en direction du cœur de village

Vue proche de la décharge, terrain chaotique colonisé essentiellement par de la clématite sauvage

Le coteau boisé secteur ouest et l'ancien tracé de la sente des Fourneaux

Le four à chaux et ses abords en pied de coteau secteur ouest

ANCIENNE DECHARGE LES FOURNEAUX AVANT TRAVAUX

ANCIENNE DECHARGE LES FOURNEAUX AVANT TRAVAUX

ANCIENNE DECHARGE LES FOURNEAUX DURANT LES TRAVAUX.
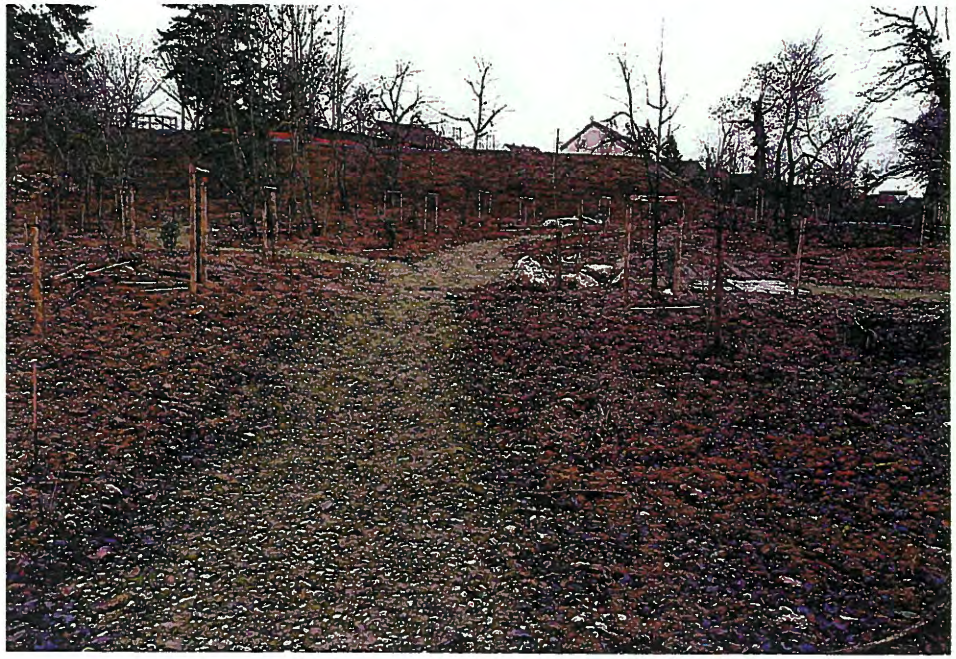
PHOTOS SITE ANCIENNE DECHARGE "LES FOURNEAUX" - 12/12/2012
